

～ 工事のお知らせ 《国道301号西浜名橋耐震補強工事》 ～

1. 工事概要

- 1) 工事名 令和元年度[第31-D7281-01号] (国) 301号 防災・安全交付金 (橋梁耐震対策) 工事 (西浜名橋耐震補強工)
- 2) 施工場所 静岡県湖西市新居町新居地内
- 3) 工期 令和元年9月18日 ～ 令和3年7月30日
- 4) 発注者 静岡県 浜松土木事務所
- 5) 請負者 五洋建設株式会社 静岡営業所

2. 工事事務所及び現場組織


工事事務所 五洋建設 西浜名橋耐震補強工事事務所  
 住所 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島3481-37 ビスタ弁天202号室  
 電話 053-489-6030  
 ファックス 053-489-6031  
 現場代理人 宮崎 恵介 080-2023-2786 (携帯)  
 監理技術者 前田 寛 090-5003-6454 (携帯)

3. 工程表

工 種	数量	単位	令和元年度(2019年)												令和2年度(2020年)												令和3年度(2021年)											
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月								
準備工	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
フーチング掘削 懸架台船組立			[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
仮橋切工			[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
P3,P6,P9,P12	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
函体設置	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
鋼製補強工			[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
P3,P6,P9,P12	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											
安全監視船	1	式	[スケジュール]												[スケジュール]												[スケジュール]											

工 種	数量	単位	令和2年																	
			4月						5月						6月					
			10	20	30		10	20	31		10	20	30							
仮橋切工			[スケジュール]																	
P9	1	式	[スケジュール]																	
P6	1	式	[スケジュール]																	
P3	1	式	[スケジュール]																	
P12	1	式	[スケジュール]																	
函体設置	1	式	[スケジュール]																	

4. 作業状況図 (鋼製函体設置時) 【作業時間：日の出～日没】

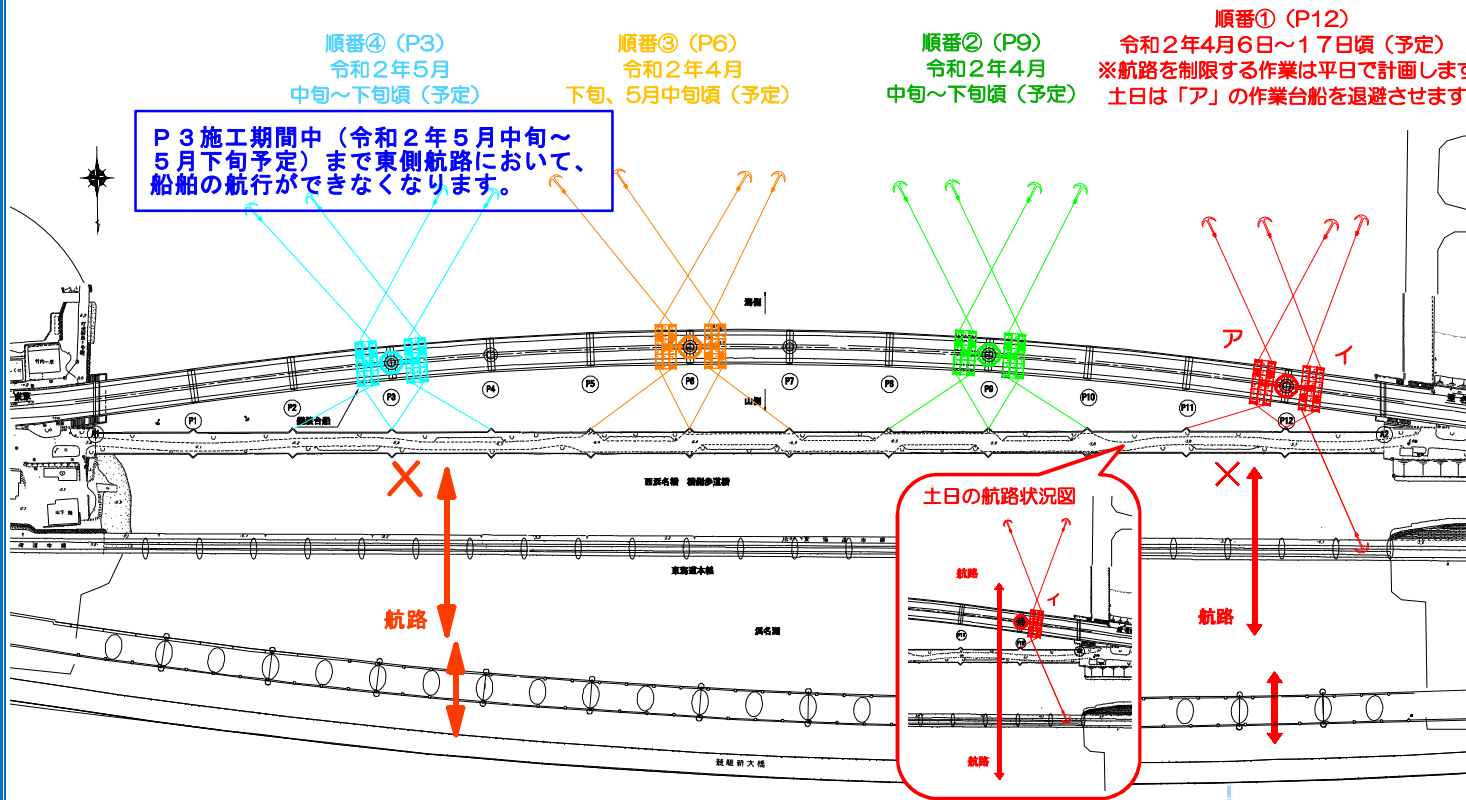

【鋼製函体設置作業について】

- ・作業は1橋脚ずつ行います。
- ・作業日には対象エリアの上下流側に安全監視船を各1隻ずつ、計2隻配置します。
- ・作業期間中は、夜間も現場海域に作業台船を係留したままになります。
- ・作業船アンカー上部及び作業台船には簡易標識灯を設置します。

**・P12施工期間中 (4月6日～17日予定) の平日、西側航路において大型船舶の航行ができなくなります。【気象・海象により工期が伸びる場合があります】**

作業期間中はお不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
